






**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA
DE HABITAÇÃO**

**Fundo Municipal de Saneamento
Ambiental e Infraestrutura - FMSAI**

Relatório Prestação de Contas FMSAI Exercício 2024

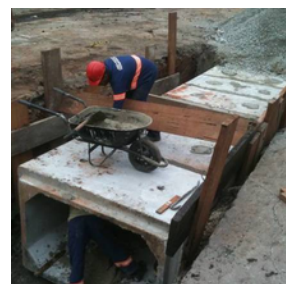

Secretaria Executiva do
Conselho Gestor do FMSAI





Sumário

Apresentação	2
Resumo das Atividades CGFMSAI	3
Receitas	4
Destinação de Recursos	5
Conclusão	11
Anexo I - Lista de Ações, Recursos e Prestações	12



◆ Apresentação

A Lei Municipal 14.934/2009 além de autorizar o Poder Executivo a celebrar contratos e convênios com o Estado, SABESP e ARSESP, previu a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI, com a finalidade de apoiar as ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município, sua Receita é oriunda de repasses trimestrais referentes a 7,5% da Receita da Companhia no Município, e os critérios de aplicação foram estabelecidos no Artigo 6º da referida Lei.

Já a Lei 18.107/2024 garantiu a manutenção do contrato com o processo da privatização da SABESP, e trouxe outras vantagens para o município, entre elas a antecipação de 5.5% das Receitas do Fundo de 2026-2029. Também incluiu um representante do Comitê Municipal de Segurança Hídrica - CMSH no Conselho Gestor do FMSAI, que passou a ser composto por oito Secretários Municipais, três membros da Sociedade Civil representantes de outros Conselhos Municipais, e um representante de CMSH.

As reuniões do Conselho Gestor são ordinariamente a cada seis meses e extraordinariamente sempre que necessário, a Presidência cabe ao Secretário Municipal da Habitação - SEHAB e a Vice-Presidência ao Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente. Dentre as atribuições do Conselho a principal é deliberar sobre os investimentos a serem realizados com os recursos do Fundo, o que é feito através de Planos de Investimentos anuais. O Conselho possui uma Secretaria Executiva lotada na SEHAB.

O Conselho Gestor do FMSAI

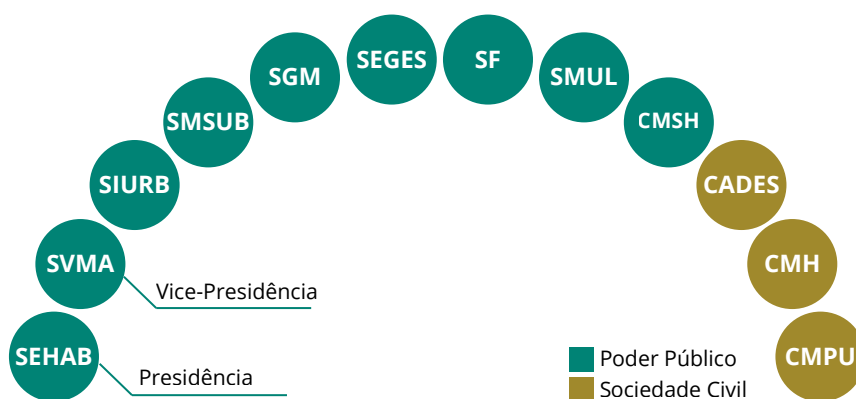


Diagrama 1 - Composição do Conselho Gestor do FMSAI

Poder Público:

SEHAB - Secretaria Mun. de Habitação
SVMA - Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente
SIURB - Secretaria Mun. de Infraestrutura Urbana e Obras
SMSUB - Secretaria Mun. das Subprefeituras
SGM - Secretaria do Governo Municipal
SEGES - Secretaria Mun. de Gestão
SF - Secretaria Mun. da Fazenda
SMUL - Secretaria Mun. de Urbanismo e Licenciamento
CMSH - Comitê Municipal de Segurança Hídrica

Sociedade Civil:

CADES - Conselho Mun. de Desenvolvimento Sustentável
CMH - Conselho Mun. de Habitação
CMPU - Conselho Mun. de Política Urbana

Objetivo

O presente documento elaborado pela Secretaria Executiva busca consolidar e apresentar as atividades e deliberações do Conselho Gestor, os resultados dos trabalhos e investimentos realizados pelas Secretarias Executoras no Exercício de 2024, demonstrando a compatibilidade das ações e a conformidade com os valores aprovados.





Atividades do Conselho Gestor do FMSAI

◆ Reuniões e Resoluções do Conselho Gestor do FMSAI em 2024

Em 2024, o Conselho Gestor do FMSAI se reuniu quatro vezes, e, por conta do curto prazo para a convocação, foram convocadas Reuniões Extraordinárias, conforme apresentado no **Quadro 1**, onde constam os links para consulta das Atas das Reuniões.

Quadro 1. Síntese das Reuniões do Conselho Gestor do FMSAI em 2024

Reunião	Data	Ata
29ª Reunião Extraordinária do FMSAI	20/03/2024	link
30ª Reunião Extraordinária do FMSAI	24/07/2024	link
31ª Reunião Extraordinária do FMSAI	30/08/2024	link
32ª Reunião Extraordinária do FMSAI	19/12/2024	link

Nas Reuniões foram apresentadas as informações sobre a execução Orçamentária e Financeira do Fundo e foram aprovadas Resoluções que modificaram o Plano de Investimentos do Exercício 2024, conforme estabelecido pela Lei 14.934/09, inclusive com a suplementação de recursos decorrentes da antecipação prevista no processo de Privatização da SABESP. E também se definiu o Plano de Investimentos para o Exercício seguinte. Resumimos as Resoluções aprovadas no quadro abaixo:

Quadro 2. Síntese das Resoluções do Conselho Gestor do FMSAI em 2024

Resolução	Data	Assunto	Links
96	20/03/2024	Aprova o Plano de Investimentos Modificado do FMSAI para o exercício de 2024 na Fonte 03 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras providências.	link
97	24/07/2024	Referenda as autorizações realizadas “ad Referendum” do Conselho Gestor pelo Presidente para incluir ações e suplementações de recursos nos Planos das Secretarias SVMA, SMSUB e SEHAB; e aprova modificação no Plano de SIURB.	link
98	24/07/2024	Aprova a prestação de contas parcial do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI do exercício 2022	link
99	31/08/2024	Aprova o Plano de Investimentos Modificado, incluindo valor da antecipação, do FMSAI para o exercício de 2024 na Fonte 03 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras providências.	link
100	19/12/2024	Referenda as autorizações realizadas “ad Referendum” do Conselho Gestor pelo Presidente para incluir ações e suplementações de recursos nos Planos das Secretarias SMSUB e SEHAB; e aprova modificações nos Planos de SIURB e SMSUB.	link
101	19/12/2024	Aprova o Plano de Invesmentos para o exercício de 2025 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras providências.	link



Balanços Orçamentários e Financeiros 2024

Conforme Artigo 11, inciso VII, é atribuição do Conselho Gestor dar publicidade à Execução Orçamentária e Financeira do FMSAI, com este objetivo a Secretaria Executiva instruiu o Processo SEI 6014.2024/0000357-2 para o registro dos Balanços, sendo publicados no Diário Oficial mensalmente, com posterior encaminhamento para verificação de SF/SUTEM/DECON, e finalmente publicados no endereço eletrônico do Fundo, dentro do Portal da Secretaria Municipal de Habitação:

Link: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/fmsai/

◆ Receitas

Conforme Cláusula 35 do Contrato de Prestação de Serviços, e, conforme Artigo 5º da Lei Municipal 14.934/09, a SABESP deverá destinar 7,5% de sua Receita Bruta no Município ao FMSAI, deduzidas Inadimplências dos órgãos da Prefeitura e tributos descritos no parágrafo 2º do Artigo. Os repasses são a fonte primária de recursos do Fundo e ocorrem trimestralmente. Com o processo de Privatização da SABESP, foi estabelecida a antecipação de 5,5% das Receitas previstas para 2026 a 2029, totalizando R\$ 2.280.000.000,00, que entraram na conta do FMSAI em agosto. A evolução do saldo do FMSAI e as entradas de recursos estão apresentadas no Gráfico 1 abaixo:

Gráfico 1. Entradas Receitas FMSAI Exercício 2024

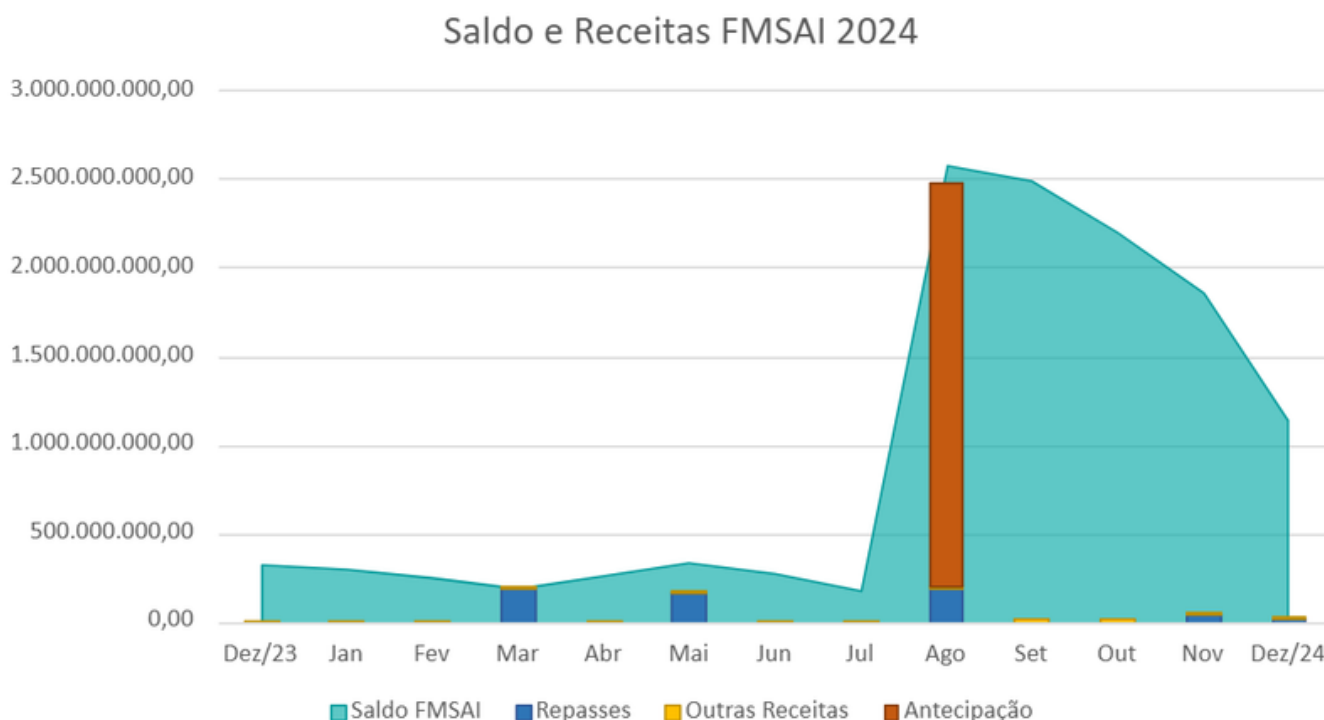


Gráfico 1- Saldos e Receitas FMSAI 2023

O Fundo iniciou o ano de 2024 com R\$ 321.673.106,27 em caixa, como observado no gráfico acima, e ao longo do exercício contou com Repasses que totalizaram R\$ 620.394.891,05. Destacando que com o processo da Privatização e assinatura de um novo Contrato, o Repasse referente ao terceiro trimestre foi dividido entre parcela do Contrato Antigo e parcela do Novo, ocorrendo, respectivamente, em novembro e dezembro. E, como mencionado, foi prevista a antecipação de 5.5% da Receita de 2026 a 2029, totalizando R\$ 2.28 bilhões de reais. O Fundo contou com rendimentos financeiros de sua aplicação e outras receitas menores, totalizando R\$ 97.440.637,69, como detalhado no Quadro 3 a seguir.

Com a execução de seus recursos pelas Secretarias e as Receitas no exercício, o Fundo manteve a liquidez e terminou o ano com R\$ 1.139.484.998,06 em caixa, e foram inscritos em Restos a Pagar R\$ 985.452.941,80 para o Exercício seguinte.





Quadro.3 Composição Receitas FMSAI Exercício 2024

Categoria	Valor
Repasses SABESP	620.394.891,05
28/03/2024	194.420.251,23
16/05/2024	168.690.201,98
19/06/2024	113.127,26
15/08/2024	192.338.594,08
19/11/2023	45.740.939,85
04/12 e 11/12/2024	19.091.776,65
Antecipação (5,5%) Receitas 2026-2029	2.280.000.000,00
Receitas Financeiras	94.894.274,39
Receitas de Depósitos Judiciais	534.999,53
Saldo não utilizados Desapropriações	2.011.363,77
TOTAL	2.997.835.528,74

Destinação de Recursos

As possibilidades de utilização dos Recursos do Fundo são descritas no Artigo 6º da Lei Municipal 14.934/2009, resumidamente são ações ligadas ao Saneamento Ambiental e Infraestrutura, como: Urbanização de Assentamentos Precários, Regularização Fundiária, Construção de Unidades Habitacionais, Ações em Drenagem, eliminação de Riscos Geológicos, Implantação de Parques e unidades de conservação.



Figura 1- Origem dos recursos e finalidades do FMSAI


O Fundo opera através de Planos de Investimentos Anuais aprovados por seu Conselho Gestor, para o Exercício 2024 o Plano foi aprovado em dezembro de 2023, na forma da Resolução 95. Ao longo do Exercício foram aprovadas as Resoluções 96, 97, 99 e 100 que modificaram o Plano de Investimentos. Os Planos são elaborados pelas Secretarias Executoras com base no Orçamento aprovado, e são consolidados pela Secretaria Executiva para apreciação do Conselho Gestor. O FMSAI teve um Orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual de R\$ 614.668.400,00, que ao longo do Exercício foi suplementado por Superávit do Exercício Anterior e por Excesso de Arrecadação, além do valor da Antecipação, que suplementou principalmente Drenagens de SIURB, Implantação de Parques da SVMA e ações de SEHAB.





O Orçamento Atualizado totalizou R\$ 3.225.183.394,84, abaixo apresentamos a divisão do Orçamento Inicial e Final por Secretaria e seus Programas:

Divisão Orçamento FMSAI 2024

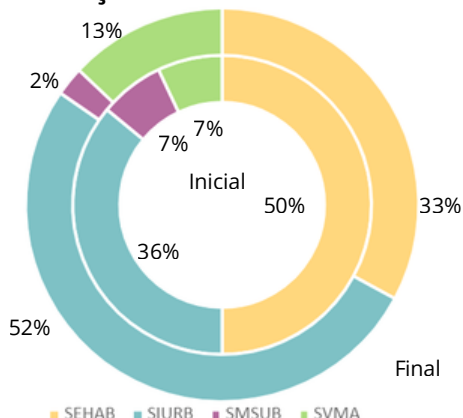


	Orçamento Inicial	Orçamento Final
SEHAB	307.334.200,00	1.061.301.423,88
SIURB	221.280.624,00	1.667.764.119,10
SVMA	43.026.788,00	77.058.287,74
SMSUB	43.026.788,00	419.059.564,12
TOTAL	614.668.400,00	3.225.183.394,84

Programa	Valor Programa	Total Secretaria
SEHAB		
Construção de Unidades Habitacionais	76.403.689,29	1.061.301.423,88
Regularização Fundiária	75.731.849,24	
Urbanização de Favelas	157.425.841,35	
Programa Mananciais	751.740.044,00	
SIURB		
Intervenções no Sistema de Drenagem	1.666.764.119,10	1.667.764.119,10
Compensações Ambientais	1.000.000,00	
SMSUB		
Intervenções no Sistema de Drenagem	32.500.000,00	77.058.287,74
Ações em Áreas de Risco - Preventivas	44.558.287,74	
Ações em Áreas de Risco - Emergenciais	-	
SVMA		
Implantação de Parques Urbanos	225.243.063,38	419.059.564,12
Requalificação de Parques Urbanos	18.959.987,86	
Implantação de Unidades de Conservação	174.854.512,88	
Requalificação de Unidades de Conservação	2.000,00	

Gráfico 2 - Divisão do Orçamento atualizado por Secretarias e Programas

A execução dos recursos aprovados para o Exercício, considerando os Restos a Pagar liquidados e pagos em 2025, totalizou R\$ 3.081.348.620,70 Empenhados, dos quais foram Liquidados R\$ 2.747.628.128,49, resultando em 85% de execução do aprovado, conforme gráfico abaixo.

Execução dos Recursos FMSAI 2024 por Secretaria

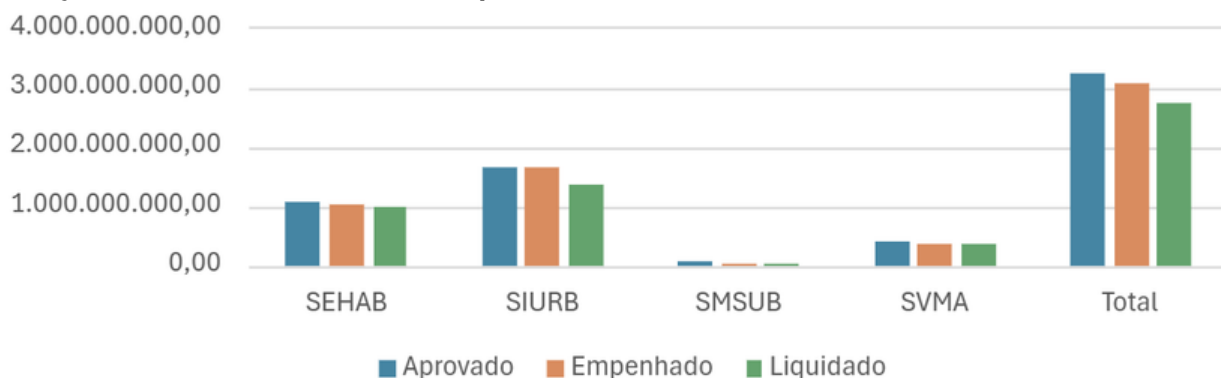

Secretaria	Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago	% Execução
SEHAB	1.061.301.423,88	1.011.280.928,66	977.789.327,84	977.789.327,84	92%
SIURB	1.667.763.118,10	1.644.833.035,27	1.361.797.456,25	1.361.797.456,25	82%
SMSUB	77.058.287,74	44.298.125,04	38.391.662,17	38.391.662,17	50%
SVMA	419.059.564,12	380.936.531,73	369.649.682,23	369.649.682,23	88%
Total	3.225.182.393,84	3.081.348.620,70	2.747.628.128,49	2.747.628.128,49	85%

Gráfico 3 - Execução dos valores aprovados por Secretaria

Na sequência será apresentada de forma resumida a execução de cada Secretaria, a lista detalhada das ações que receberam recursos do Fundo no Exercício consta no Anexo I do Relatório, incluindo dados contratuais, valores e Documento ou Processo SEI no qual consta a Prestação de Contas delas.



◆ Ações da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB

A SEHAB possui ações nos Programas de Construção de Unidades Habitacionais, Urbanização de Favelas, Regularização Fundiária e Programa Mananciais. Para o Exercício 2024 a Secretaria instruiu o Processo SEI 6014.2024/0000480-3 para consolidar a documentação da Solicitação de Recursos e eventuais modificações ao longo do Exercício, no processo constam formulários com informações pormenorizadas das ações e Cronograma com os valores. Também foi instruído o Processo 6014.2024/0001814-6 para consolidar a Prestação de Contas dos Investimentos realizados.

No anexo I do presente relatório estão todos os valores utilizados pela Secretaria, bem como número do Processo ou Documento SEI da Prestação de Contas.



Figura 2 - Cocaia - João Cabanas Lotes 4 e 8

Exemplos de Ações da SEHAB



Figura 3 - Regularização Fundiária - São Francisco



Figura 4 - Provisão - Vila Nordestina



Figura 5 - Núcleo Sálvia Lotus

Abaixo apresentamos resumo dos valores executados por Programa para a SEHAB, a Pasta teve uma execução de 92% na relação Aprovado x Utilizado, com o Programa Mananciais responsável pela maior parcela do Orçamento da Secretaria com uma execução 98%, enquanto o Programa de Regularização Fundiária executou apenas 49% do valor aprovado, já os Programas de Construção de Unidades Habitacionais e o de Urbanização, tiveram, respectivamente, uma execução de 87 e 88%.

Programa	Valor Aprovado	Valor Utilizado	% Execução
Construção de Unidades Habitacionais	76.403.689,29	66.804.550,28	87%
Regularização Fundiária	75.731.849,24	36.730.800,54	49%
Urbanização de Assentamentos Precários	157.425.841,35	138.350.459,16	88%
Programa Mananciais	751.740.044,00	735.903.517,86	98%
Total	1.061.301.423,88	977.789.327,84	92%

Foram utilizados recursos nas ações aprovadas conforme aprovado pelo Conselho Gestor nas Resoluções 96,97, 99 e 100, todas em consonância com o disposto no Artigo 6º da Lei Municipal 14.934/09, e dentro dos valores aprovados por Programa. Contudo, a única ressalva a ser feita é referente à utilização de recursos superiores ao aprovado, compensado por uma utilização menor em outras ações, nas ações Gleba do Pêssego, Chácara Bela Vista e Lotes dos Mananciais. Embora o valor liquidado nos Programas tenha permanecido dentro do aprovado, formalmente, o correto seria solicitar previamente o remanejamento de recursos entre as ações, conforme Inciso II das Resoluções 95, 96 e 99 .



◆ Ações da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

A SMSUB possui ações nos Programas de Intervenções no Sistema de Drenagem e Ações em Áreas de Risco Geológicos. Para o Exercício 2024 a Secretaria instruiu o Processo SEI 6012.2024/0004798-6 para consolidar a documentação da Solicitação de Recursos e eventuais modificações ao longo do Exercício, no processo constam formulários com informações pormenorizadas das ações e Cronograma com os valores. Também foi instruído o Processo 6012.2024/0031077-6 para consolidar a Prestação de Contas dos Investimentos da Secretaria. No anexo I do presente relatório são apresentados os valores utilizados pela Secretaria, bem como número do Processo ou Documento SEI da Prestação de Contas.



Figura 6 - Drenagem Córrego do Jardim Vitória (SUB-CT)

Exemplos de Ações da SMSUB



Figura 7 - Drenagem Córrego Lajeado (SUB-IT)



Figura 8 e 9 - Drenagem Córrego Tabatinguera -Rua Madalena Madureira (SUB-CV)



Abaixo apresentamos resumo dos valores aprovados por Programa para a SMSUB e o montante utilizado pela Secretaria, tendo uma execução de 50% na relação Aprovado x Utilizado. O Programa de Intervenções no Sistema de Drenagem contou com 6 obras aprovadas, das quais 2 tiveram liquidações, totalizando 51% de execução, enquanto o Programa de Ações em Áreas de Risco Geológico contou com 7 obras aprovadas, das quais 3 tiveram liquidações, totalizando 49% de execução. Algumas obras não tiveram execução devido a suspensão por necessidade de remoções, ou por aguardar anuência de outro Órgão, outras por estarem em licitação e num caso específico a execução passou para outra Secretaria.

Programa	Valor Aprovado	Valor Utilizado	% Execução
Intervenções no Sistema de Drenagem	32.500.000,00	16.498.810,11	51%
Obras em Áreas de Risco Geológico	44.558.287,74	21.892.852,06	49%
Total	77.058.287,74	38.391.662,17	50%

As ações realizadas pela SMSUB estão em consonância com o Artigo 6º da Lei Municipal 14.934/09 em seu Inciso VI, e dentro dos valores aprovados pelo Conselho Gestor; o material apresentado pela Secretaria está a contento, podendo ter a sua aprovação pelo Conselho Gestor.



◆ Ações da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA

A SVMA possui ações nos Programas de Construção, Implantação e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares e Construção e, Implantação e Requalificação de Unidades de Conservação. Para o Exercício 2024 a Secretaria instruiu o Processo SEI 6027.2024/0004340-0 para consolidar a documentação da Solicitação de Recursos e eventuais modificações ao longo do Exercício, no processo constam formulários com informações pormenorizadas das ações e Cronograma com os valores. Foi instruído o Processo 6027.2025/0003417-9 para consolidar a Prestação de Contas dos Investimentos da Secretaria. No anexo I do presente relatório estão todos os valores utilizados pela Secretaria.



Figuras 10 - Floresta Municipal - Fazenda Castanheira

Exemplos de Ações da SVMA



Figura 11 - Pq. Consciência Negra



Figura 12 - Pq. Apurá - Búfalos



Figura 13 - Pq. Pinheirinho D'água Requalificação

A SVMA apresentou uma execução de 88% na relação entre recurso Aprovado x Utilizado. O Programa de Construção e Implantação de Parques Urbanos contou com 5 Obras aprovadas, 3 com execução, já a Requalificação e Ampliação de Parques contou com 9 Ações aprovadas, 5 com execução. O Programa de Implantação de Unidades de Conservação contou com uma ação aprovada com execução, e o de Ampliação e Requalificação de Unidades contou com uma ação sem execução. Além das obras, com o recurso da antecipação, a Secretaria conseguiu realizar diversas desapropriações para a implantação de 26 Parques e Unidades de Conservação para o Programa São Paulo Capital Verde, com 320 milhões investidos na aquisição de imóveis, desapropriações e serviços técnicos. Abaixo quadro resumo:

Programa	Valor Aprovado	Valor Utilizado	% Execução
Implantação de Parques Urbanos	225.243.063,38	194.999.614,79	87%
Requalificação de Parques Urbanos	18.959.987,86	15.379.014,49	81%
Implantação de Unidades de Conservação	174.854.512,88	159.271.052,95	91%
Requalificação de Unidades de Conservação	2.000,00	0,00	0%
Total	419.059.564,12	369.649.682,23	88%

As ações realizadas pela SVMA estão em consonância com o Artigo 6º da Lei Municipal 14.934/09 em seu Incisos V e VII, e dentro dos valores aprovados pelo Conselho Gestor na Resolução 100, a documentação apresentada pela Secretaria tanto na solicitação quanto na prestação foi satisfatória.



◆ Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB

A SIURB possui ações nos Programas de Intervenções no Sistema de Drenagem e em Compensações Ambientais. Para o Exercício 2024 a Secretaria instruiu o Processo SEI 6022.2024/0000315-0 para consolidar a documentação da Solicitação de Recursos, o Processo 6022.2024/0002322-4 para as modificações com as suplementações utilizando o superávit, e, posteriormente com o valor da antecipação, nos processos constam formulários com informações e cronograma das ações. Foi instruído o Processo 6022.2025/0004027-9 para consolidar a Prestação de Contas. No anexo I do presente relatório estão todos os valores utilizados pela Secretaria.



Figura 14 - Córrego Aricanduva

Exemplos de Ações da SIURB



Figura 15 - Córrego Lajeado



Figura 16 e 17- Antes e Depois Córrego Jacupeval

Abaixo apresentamos resumo dos valores aprovados por Programa da SIURB e o montante utilizado pela Secretaria, tendo uma execução de 82% na relação Aprovado x Utilizado. O Plano de Investimentos da SIURB contou basicamente com o Programa de Intervenções no Sistema de Drenagem, com 155 obras aprovadas, das quais 60 sem execução. Com a antecipação foi possível executar um grande número de obras emergenciais e suplementar a execução das grandes obras de drenagem da Pasta. Também integravam o Plano serviços técnicos, como projetos e gerenciamentos, além de desapropriações e Compensações Ambientais necessárias para as ações da Secretaria. Abaixo quadro resumo:

Programa	Valor Aprovado	Valor Utilizado	% Execução
Intervenções no Sistema de Drenagem	1.666.642.286,96	1.360.797.456,27	82%
Compensações Ambientais	1.120.831,14	999.999,98	89%
Total	1.667.763.118,10	1.361.797.456,25	82%

As ações realizadas pela SIURB estão em consonância com o Artigo 6º da Lei Municipal 14.934/09 em seus Incisos II, VI e VII, e dentro dos valores aprovados por Programa pelo Conselho Gestor na Resolução 100 para os Programas, contudo, foram identificados alguns valores acima do Aprovado em algumas obras, compensados por execução menor em outras, o que deveria ter sido solicitado previamente ao Presidente do Conselho Gestor. Além dessas ações, duas tiveram execuções em dotações diferentes, como PMRR e uma compensação ambiental na dotação de serviços. E, foram identificadas algumas execuções que não integravam o Plano de Investimentos, a saber: 192/SIURB/2024 Córrego Abacateiro, 184/SIURB/24 Córrego Itupu, 187/SIURB/24, Av. Gastão Vidigal, 188/SIURB/24, Av. Morvan Dias Figueiredo e 351/SIURB/23 Normas Técnicas de Pavimentação Urbana.



O procedimento correto seria a solicitação da inclusão dessas ações em Resolução aprovada pelo Conselho. Apesar disso, a execução destas não traz prejuízo, uma vez que foram ações necessárias à Municipalidade e são finalidades previstas no Artigo 6º da Lei 14.934/09.

◆ Conclusão

Diante do apresentado no presente relatório e seu anexo, e, com base na documentação apresentada pelas Secretarias Executoras, esta Secretaria Executiva do Conselho Gestor do FMSAI sugere a aprovação, com as ressalvas, da Prestação de Contas do Exercício 2024 totalizando R\$ 2.747.628.128,50 (dois bilhões, setecentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), sendo utilizado: Por SEHAB R\$ 977.789.327,85 (novecentos e setenta e sete milhões, setecentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), por SIURB R\$ 1.361.797.456,25 (um bilhão, trezentos e sessenta e um milhões, setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), por SMSUB R\$ 38.391.662,17 (trinta e oito milhões, trezentos e noventa e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), e por SVMA R\$ 369.649.682,23 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). Encerrando a Prestação de Contas do FMSAI dos recursos destinados às quatro Secretarias no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Destacamos que a Secretaria Executiva analisou e identificou todas as 1679 liquidações dos Empenhos efetuados em 2024, incluindo os Restos a Pagar, verificando a compatibilidade da utilização dos recursos com as atribuições do FMSAI, bem como analisou a documentação apresentada para a Prestação de Contas pelas Secretarias, sendo consolidado o Anexo I do presente relatório. Embora a maior parte dos recursos tenha sido utilizada em conformidade, foram identificados raros casos de SIURB nos quais foram utilizados recursos em ações não previstas no Plano de Investimentos, apesar de em consonância com as atribuições do Fundo, e, alguns casos nos quais as Secretarias Executaram valores maiores do que os valores aprovados individualmente para algumas ações, compensando com execuções menores em outras, permanecendo dentro dos totais aprovados por Programa. Apesar de não comprometer a finalidade geral do Fundo, tal prática representa um desvio do plano original. A aprovação com ressalvas visa reconhecer a boa gestão geral, ao mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de maior rigor na aderência ao Plano de Investimentos em períodos futuros. Recomenda-se que as Unidades sejam orientadas a seguir de forma estrita as diretrizes aprovadas para evitar ocorrências semelhantes.

Secretaria Executiva do
Conselho Gestor do FMSAI





Anexo I - Planilha Prestação de Contas FMSAI 2024 - Detalhamento

Anexo I



ANEXO I - PRESTAÇÃO DE CONTAS FMSAI - EXERCÍCIO 2024 - Ações Executadas e Valores

Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3354.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6014.2022/0001771-5	Zakinarch- Consórcio Granjeir	005/2024	Zaki Narchi - 2º Etapa (reforma)	6.245.589,04	6.202.541,85	142120641
6014.2021/0002440-0	Almeida Sapata	011/2023	Água Branca - 5ª Etapa (prazo: 6 meses)	2.150.857,86	2.063.130,70	142120059
6014.2021/0002423-0	Almeida Sapata	004/2022	Real Parque (Reforma + AVCB)	1.903.553,10	1.903.546,95	142120292
6014.2022/0000930-5/2011.0.363.022-5	Engelux	035/2012	Major Paladino	12.454.781,39	12.454.781,39	142120781
6014.2019/0003745-16014.2021/0002493-0	Scopus Constr. e Incorp. LTDA	006/2022	Paraisópolis Parque Sanfona - Cond. J,K e L	1.010.400,00	-	142121001
6014.2020/0001142-0	CONS. ABC	011/2022	Residencial Esmeralda	1.500.000,00	1.017.624,19	142121147
2011-0.362.995-2 6014.2018/0002869-8	FSMFRAI DA BLK/Kallas	033/2012	Domênico Martinelli/Viella da Paz	2.800.000,00	2.799.819,09	146936837
7610.2022/0000930-8	Construtora e Incorp. Faleiros	-	Residencial Bruno Covas Favela Violão 2	2.500.000,00	-	N.A.
7610.2022/0000929-4	Construtora e Incorp. Faleiros	-	Residencial Bruno Covas Favela Violão 3	2.500.000,00	-	N.A.
Totais				33.065.181,39	26.441.444,17	

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3354.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6014.2023/0000642-1	Consórcio Habitação SP	002/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 1	7.121.022,19	6.740.659,55	142113665
6014.2023/0000647-2	Consórcio Urban SP	003/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 2	4.896.759,46	4.609.301,11	142113979
6014.2023/0000650-2	Consorcio Habitacional SP	004/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 3	5.728.408,00	5.726.816,73	142112771
6014.2023/0000652-9	Consorcio Habita GJMC	005/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 4	3.429.907,98	3.429.907,99	142113231
6014.2020/0001402-0	Nucleo Engenharia	015/2021	Jardim Colombo - 2ª Fase	499.999,95	204.725,87	142115959
6014.2022/0000371-4	Officeplan Planej. e Gerenciamento	013/2022	WPA- Monitoramento	-	-	142121452
6014.2022/0000361-7	VR Demolidora LTDA	024/2022	WPA - Demolição	60.535,43	60.535,43	142121552
6014.2021/0003407-3	Airlab Analítica	012/2022	Zaki Narchi (monitoramento - 2ª Fase)	505.466,36	415.278,67	142120441
6014.2018/0000218-4	Cobrape	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 1	7.466.259,43	7.173.444,17	142111733
6014.2019/0004271-4	Diagonal	020/2019	Gerenciamento Social / Lote 2	11.280.433,52	10.628.961,25	142112320
Á Licitar	Á Licitar	-	Pinhalzinho	-	-	N.A.
6014.2024/0000827-2	Consórcio Urbhis	033/2024 – SEHAB	Gerenciamento Social / Lote 1	1.285.651,58	704.997,92	147302579
6014.2024/0000827-2/6014.2024/0005348-0	Diagonal Empreem. e Gestão de Neg. LTDA	034/2024 – SEHAB	Gerenciamento Social / Lote 2	1.062.064,00	668.477,43	147302903
Totais				43.336.507,90	40.363.106,12	

PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3356.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6014.2023/0001030-5	Consórcio Consenge - SP Regulariza	006/2023 - SEHAB	Serviços Tecnicos de Regularização Fundiária - Lote 1: Áreas Norte e Centro	7.566.205,69	6.257.236,04	142118803
6014.2023/0001029-1	Consórcio LBR Regulariza SP	007/2023 SEHAB	Serviços Tecnicos de Regularização Fundiária - Lote 2: Áreas Leste	8.571.774,93	7.345.049,98	142116303
6014.2023/0001028-3	Consórcio DGSP	008/2023 SEHAB	Serviços Tecnicos de Regularização Fundiária - Lote 3: Áreas Sul e Sudeste	6.991.405,59	5.466.183,71	142119279
6014.2023/0001027-5	Consórcio Reurb SP	009/2023 SEHAB	Serviços Tecnicos de Regularização Fundiária - Lote 4: Áreas Extremo Sul	6.634.239,15	5.934.150,01	142116825
7610.2023/0003097-0 / 7610.2024/0003532-9	Almeida Sapata	096/2024 - COHAB	Gleba do Pêssego	6.967.223,88	11.728.180,80	147326092
Á Licitar	Á Licitar	-	Vila Bela (COHAB)	5.000.000,00	-	N.A.
Totais				41.730.849,24	36.730.800,54	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3356.4.4.90.61.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6014.2022/0002706-0	Caixa d'Água			34.000.000,00	-	N.A.
Totais				34.000.000,00	-	

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3357.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
2011-0.362.986-3 / 6014.2018/0002928-7	Andrade Valladares	037/2012	Jardim Continental / Parque das Flores	58.617.003,22	57.690.464,78	142116577
6014.2020/0002269-3	BLK/Progrebior	023/2022	Jardim da Paz (Obras)	6.525.000,00	4.860.231,52	142116947
6014.2020/0002110-7	BLK/Progrebior	007/2022	Alfredo Ávila	2.369.003,79	976.954,00	142117101
6014.2022/0000504-0	Á Licitar	-	Jardim Aurora	-	-	N.A.
6014.2022/0000532-6	FBF Construções LTDA.	002/2024	Jardim Vitória I e II	6.909.160,49	6.867.763,88	142123303
6014.2023/0004435-8	Á LICITAR	Á LICITAR	Jardim Arantes	-	-	N.A.
Á LICITAR	Á Licitar	-	Sítio da Formigas	-	-	N.A.
Á LICITAR	Á Licitar	-	Morro Doce	-	-	N.A.
Á LICITAR	Á Licitar	-	Domingos da Guia	-	-	N.A.
2010-0.046.947-2 6014.2018/0003039-0	TRANSVIAS	014/2010	Lidiane	2.000.000,00	2.838.180,72	142114389
2010-0.046.947-2 6014.2018/0003039-0	TRANSVIAS	014/2010	Bamburral	1.500.000,00	600.723,37	142114527
6014.2019/0002921-1	ETC & SCHUNK	014/2020	Paraisópolis Córrego Colombo - 1ª Etapa	6.826.266,36	1.696.589,55	142115105
6014.2020/0000421-0	TRANSVIAS	014/2020	Paraisópolis Córrego Antonico	6.000.000,00	5.988.253,00	142115287
2010-0.046.947-2 6014.2018/0003039-0	FM Rodrigues	014/2010	Córrego da Mina	4.788.296,07	4.788.233,19	142115105
6014.2022/0003235-8	Consórcio Granjeir	004/2024	Chácara Bela Vista	1.000.000,00	1.810.194,57	142123404
6014.2020/0000553-5						
6014.2024/0001928-2	H E Engenharia LTDA.	023/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco A1	505.423,16	505.361,61	142123557
6014.2024/0001931-2	H E Engenharia LTDA.	026/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco B2	493.380,31	465.638,14	142123685
6014.2024/0001929-0	H E Engenharia LTDA.	024/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco A2	501.337,22	338.927,93	142123843
6014.2024/0001938-0	H E Engenharia LTDA.	031/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco G3 e G4	383.044,61	254.067,39	142124059
6014.2024/0001933-9	H E Engenharia LTDA.	028/2024 - SEHAB	C.H. SAPÉ - BLOCO C4, C5 e C6	502.523,54	390.437,19	142124207
6014.2024/0001930-4	H E Engenharia LTDA.	025/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco B1	510.273,87	342.397,26	142124355
6014.2024/0001935-5	H E Engenharia LTDA.	030/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco F2 e F3	510.273,87	278.450,15	142124584
6014.2024/0001932-0	H E Engenharia LTDA.	027/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco C1, C2 e C3	385.980,38	313.317,04	142124714
6014.2024/0001937-1	H E Engenharia LTDA.	32/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco G1 e G2	639.811,23	504.664,01	142124955
6014.2024/0001934-7	H E Engenharia LTDA.	029/2024 - SEHAB	C.H. Sapé - Bloco F1	380.684,79	209.026,50	142125249
Totais				101.347.462,91	91.719.875,80	

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3357.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6021.2020/0033492-8	MMF Projetos de Engenharia e Consórcio Habitação SP	008/2022	Manacá da Serra	-	-	N.A.
6014.2023/0000642-1	Consórcio Urban SP	002/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 1	10.530.945,72	9.987.519,54	142113819
6014.2023/0000647-2	Consórcio Urban SP	003/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 2	7.280.094,95	6.649.795,95	142114133
6014.2023/0000650-2	Consorcio Habitacional SP	004/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 3	-	-	142113134
6014.2023/0000652-9	Consorcio Habitacional SP	005/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 4	-	-	142113544
6014.2020/0001402-0	Nucleo Engenharia	015/2021	Jardim Colombo - 2ª Fase	419.999,97	274.728,28	142116120
6014.2018/0000218-4	Cobrape	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 1	11.116.766,12	10.462.442,66	142111970
6014.2019/0004271-4	Diagonal	20/2019	Gerenciamento Social / Lote 2	17.666.351,26	15.928.622,87	142112159
6014.2024/0000827-2	Consórcio Urbhis	033/2024	Gerenciamento Social / Lote 1	1.587.241,46	752.349,46	142125426
6014.2024/0000827-2 / 6014.2024/0005348-0	Diagonal Empre. e Gestão de Neg. LTDA	034/2024	Gerenciamento Social / Lote 2	5.063.191,24	2.575.124,60	147303342
6014.2024/0003767-1	Á Licitar	-	Sítio Itaberaba II	413.787,72	-	N.A.
Totais				54.078.378,44	46.630.583,36	

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEHAB – 86.14.16.451.3002.3357.4.4.90.61.00.03

Processo Adm.	Identificação da Ação	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
	Viário Parque das Flores	1.000.000,00	-	N.A.
	Estrada de Itabecérica	1.000.000,00	-	N.A.
Totais		2.000.000,00	-	

PROGRAMA MANANCIAIS (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB – 86.14.16.482.3005.3355.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
2011-0.358.976-4 / 6014.2018/0002469-2	Villanova	032/2012	Lote 1: Boulevard da Paz (e projetos)	36.365.193,97	42.191.533,63	142117983

2011-0.358.974-8 / 6014.2018/0002474-9	EIT	031/2012	Lote 2: Jardim Arnaldo A / Jardim João Manuel Vaz / Jardim Angela II / Jardim /fujihara I, III e Jardim Nakamura II / Xamborés (e projetos)	24.621.136,18	32.143.044,21	142119781
2011-0.358.978-0 / 6014.20180002213-4	Águas Limpas (Planova / Planova)	028/2012	Lote 3: Jardim Tancredo, Cavalo Branco (Etapas I e II) / Chácara Flórida - Bandeirantes, Batista Bassano A, Jardim Colorado, Jardim Capela e Angelo Tarsini A (e projetos)	9.581.400,62	7.831.400,62	142115538
6014.2024/0003867-8	Transvias	028/2012	Lote 3 A: Jardim Tancredo, Cavalo Branco (Etapas I e II) / Chácara Flórida - Bandeirantes, Batista Bassano A, Jardim Colorado, Jardim Capela e Angelo Tarsini A (e projetos)	90.000.000,00	89.330.414,80	142115805
2011-0.358.981-0 / 6014.2018/0002770-5	Engibras	025/2012	Lote 4: Alto da Alegria / Jardim Progresso / Jardim Roschel, Anthero Gomes do Nascimento / Império I / Jardim São Judas Tadeu / Jardim São Vicente (e projetos)	33.229.044,15	37.257.804,90	142117255
2011-0.358.986-1 / 6014.2018/0002202-9	Mananciais - SP (Carioca / Passarelli)	026/2012	Lote 5: Cidade Júlia / Angelo Remazotti (Parque Linear Guaicuri / Ladainha do Mar / Parque Primavera) / Missionária V / Papa Gregório Magno, Jardim Eldorado / Mata Virgem / Travessa Mancini, Bandeirantes / Dois / Jardim Apurá / Paulistas / Rep. Lotes 10, 11 e 12 / Qd 1 - Bairro Apurá / Santa Amélia e Jardim Orion / Orion / Jardim Império - invasão (e projetos)	99.899.332,48	101.899.433,47	142117561
2011-0.358.990-0 / 6014.2018/0002792-6	Transvias	030/2012	Lote 6: Erundina e próximo ao loteamento Gaivotas (e projetos)	187.856.332,22	177.071.025,84	142117736
2011-0.358.993-4 / 6014.2018/0002754-3	Recuperação Ambiental	027/2012	Lote 7: Cantinho do Céu, Vale Verde ou Monte Verde / Carioba / Sítio Cascavel (invasão) / Fechado Eliane, Jardim Rodrigo e Jardim Nova Varginha / Estrada do Barro Branco (e projetos)	115.426.410,91	113.489.616,33	142117850
2011-0.358.998-5/ 6014.2021/0003144-9	Consórcio Soebe Etama	029/2012 005/2022	Lote 08 - UNIFAG / Condomínio Vargem Grande e Novo Silveira / Chácara Boa Esperança	104.834.405,47	98.636.030,05	142119039
Totais				701.813.256,00	699.850.303,85	

PROGRAMA MANANCIAIS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SEHAB - 86.14.16.482.3005.3355.4.4.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6014.2023/0000650-2	Consortio Habitacional SP	004/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 3	20.872.621,93	14.398.746,74	142112972
6014.2023/0000652-9	Consortio Habita GJMC	005/2023	Gerenciamento de Obras - Setor 4	11.806.993,33	6.712.170,34	142113358
6014.2018/0000218-4	Cobrape	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 1	11.756.679,91	10.597.379,16	142111862
6014.2024/0005350-2	Cobrape	035/2024-SEHAB	Gerenciamento Social / Lote 1	5.490.492,83	4.344.917,77	147303476
Totais				49.926.788,00	36.053.214,01	

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3354.4.4.90.61.00.03

Processo Adm.	Identificação da Ação	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
	Chafariz	1.000,00	-	N.A.
Totais		1000,00	-	

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3354.4.4.90.48.00.03

Processo Adm.	Identificação da Ação	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
		1.000,00	-	N.A.
Totais		1000,00	-	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - (Obras) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.1247.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
-	A Licitar	-	Licitação para Execução de Obras para Regularização - áreas diversas	1000,00	-	N.A.
-	A Licitar	-	Sítio Morada do Sol		-	N.A.
-	A Licitar	-	Sítio Rosinhas		-	N.A.
Totais				1.000,00	-	

TOTAL SEHAB - FMSAI - Fonte 03

1.061.301.423,88 977.789.327,85

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM (PROJETOS E OBRAS) - SIURB - 86.22.17.451.3008.5013.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
						No documento 144750770, pgs:
6022.2021/0000374-0	Consórcio JDP - Ribeirão Perus	037/SIURB/22	Perus - Reservatório e Canalização	70.503.572,88	84.387.132,97	1
2015-0.183.093-3 / 6022.2022/0006110-6	Consórcio CG	098/SIURB/15	Morro do "S" - Reservatório	93.453.377,65	87.547.002,72	2
6022.2021/0000686-3 7910.2022/0000483-8	Consórcio DJP Mooca	227/SIURB/22 089/SIURB/24	Reservatório Mooca 2	9.834.674,00	3.559.418,03	4
6022.2023/0002988-3	Consórcio DL	029/SIURB/23	Jardim Lapena (Canalização + Polder Reservatório)	25.890.223,33	7.325.245,37	5
6022.2023/0002526-8	Consórcio DCDC Reservatório Antonico	051/SIURB/24	Antonico - Reservatório RA-01 (DAEE) (sem canalização montante) + RA-02 (SIURB)	63.020.822,86	47.023.228,50	6
2015-0.113.934-3 e 6022.2022/0006603-5	N / A	Em contratação	Reservatório Freitas	9.001.000,00	-	7
6022.2022/0006608-6 e (2014-0.357.842-3)	Consórcio Tiisa / Compec Galasso	066/SIURB/15	Reservatório Paraguai- Éguas - Reservatório e galeria C	3.000.000,00	-	8
6022.2020/0003116-5	Almeida Sapata	130/SIURB/21	Jaques-Cousteau (Laguinho)	1.159.975,08	-	9
6022.2021/0000657-0	Verdeblanco Engenharia	016/SIURB/22	Sertanista	100.000,00	-	10
7910.2022/0000481-1	Consórcio Tiisa / Compec Galasso	009/SIURB/2016	Reservatório Machados	6.000.000,00	-	11
6022.2022/0004432-5	Consórcio Caboré	183/SIURB/23	Canalização "Caboré"(Aricanduva) trecho 1	39.291.019,52	35.541.220,19	12
6022.2023/0003764-9	Lettieri Cordaro	240/SIURB/23	Canalização "Caboré"(Aricanduva) trecho 2	4.089.641,24	9.009.734,68	13
6022.2021/0000618-9	KF2 Engenharia e Consult. EIRELI	068/SIURB/22	Cordeiro – Fase 2	1.666.823,56	-	14
6022.2021/0001049-6	Almeida Sapata	153/SIURB/23	Cachoeira dos Antunes	5.709.680,76	2.495.844,44	15
6022.2023/0001847-4	Potenza engenharia	223/SIURB/23	Rua Jacofer	31.144.144,28	31.006.606,48	16
6022.2023/0002007-0	Consórcio Recupera. Pirajuçara	279/SIURB/23	Revestimento de fundo do Córrego Pirajuçara	41.819.722,47	41.818.391,51	17
6057.2019/0002408- 7/6022.2023/0004462-9	Consórcio Canalização Veleiros	298/SIURB/23	Canalização Veleiros	33.778.592,12	14.120.822,63	18
6022.2022/0006287-0	Alameda Sapata	009/SIURB/23	Córrego São Luis	52.975.004,76	51.773.796,22	19
6022.2020/0002786-9	Almeida Sapata	017/SIURB/23	Tanquinho	207.697,24	-	20
6022.2019/0004828-7	N / A	Preparando para licite	Guaiaúna	2.071.089,48	-	21
6022.2019/0005259-4	SPObras	002/SIURB/23	Rua Alessandro Allori	1.040.895,42	-	22
6022.2021/0001066-6 6022.2022/0001275-0 (Contratação Spobras) 6022.2023/0007134-0	SPObras	020/SIURB/23	Rua Antenor Baptista	483.673,18	-	23
7910.2022/0001642-9	N / A	N / A	Giuliani	221.941,96	-	24
6022.2020/0002245-0	Planservi Engenharia	034/SIURB/21	Alto da Boa Vista	100.000,00	-	25
6022.2022/0003457-5	Potenza Engenharia	164/SIURB/22	Ipiranga	2.000.000,00	-	26
6022.2023/0001241-7	Ercan Construtora	181/SIURB/23	Obra emergencial margens de córrego - Rua Bicci Di Lorenzo	2.017.701,77	1.322.205,55	27
6022.2023/0001234-4	F.F.L Sinalização	106/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Moenda	7.673.320,61	7.673.320,61	28
6022.2023/0001258-1	Consitec Engenharia	272/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Jaboticabal	657.902,22	600.252,91	29
6022.2023/0001343-0	Apeng	108/SIURB/23	Obra emergencial Córrego Cabuçu de Baixo Jardim Peri	5.441.797,77	4.520.315,67	30
6022.2023/0001415-0	I9	205/SIURB/23	Obra emergencialmargens Córrego Maria Paula	583.917,18	583.711,27	31
6022.2023/0001423-1	FBF	214/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Rio Verde - Av. Líder x Rua Harry Dannenberg	2.593.355,00	2.593.355,00	32
6022.2023/0001521-1	Tropico	131/SIURB/23	Obra emergencial margens Interseção dos córregos Ajuá e Vargem Grande	7.159.039,62	6.213.234,19	33
6022.2023/0001556-4	HHTEC	173/SIURB/23	Obra emergencial GAP Rua Carneiro Leão x Rua Torquato Neto	1.299.056,17	1.299.056,17	34
6022.2023/0001583-1	Mathesis Engenharia	151/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Paraguassu - Rua Castelândia	466.638,96	466.638,96	35
6022.2023/0001586-6	Escopo Construtora	224/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Ponte Rasa	458.426,12	458.425,80	36
6022.2023/0002008-8	FP Projetos	186/SIURB/23	Obra emergencial GAP - Rua Rosa do Campo x Rua Sossóia	1.111.202,61	417.502,32	37
6022.2023/0002402-4	B&B	141/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Água do Frangueiro	5.468.738,07	5.458.738,66	38
6022.2023/0002570-5	B&B	179/SIURB/23	Obra emergencial margens Córrego Rio Verde - Rua Annibale Padovano	4.782.689,49	2.205.552,37	39
6022.2023/0002572-1	FFL Sinalização	213/SIURB/23	Obra emergencial talude e renagem - Estrada de Itapecerica	11.778.829,99	11.320.080,38	40

6022.2023/0006731-9	Ercan Construtora	303/SIURB/23	Obra emergencial contenção Morro da Lua - Rua Alexandre Bening (Jardim Ingá)	31.221.920,34	31.221.920,29	41
6022.2023/0003221-3	Abcon Consultoria	242/SIURB/23	Obra emergencial margens Córrego Jacupeval - Rua Cinco	4.420.446,73	3.989.088,81	42
6022.2023/0003223-0	Ramon Aguilera	308/SIURB/23	Obra emergencial drenagem - Rua Professora Nina Stocco	6.217.158,72	5.988.131,11	43
6022.2023/0003810-6	Ercan Construtora	246/SIURB/23	Obra emergencial margem Córrego Pirajussara - Rua Jorge Arida	446.468,50	445.448,75	44
6022.2023/0003762-2	Lettietti Cordado	241/SIURB/23	Obra emergencial talude margens do córrego - Rua Guian x Rua Corruiras	6.531.942,86	6.529.475,97	45
6022.2023/0002305-2	BBC Construções e Empr. LTDA	140/SIURB/23	Obra emergencial contenção das margens do Córrego Rio Verde	3.009.096,77	3.005.766,79	46
6022.2023/0005120-0	DPT Engenharia	288/SIURB/23	Obra emergencia margem córrego Rua Maria da Costa Bezerra	3.662.020,38	3.579.448,17	47
6022.2023/0004837-3	AZ Kompass	284/SIURB/23	Obra emergencial margens córrego Rua Soares de Bulhões	4.962.236,58	4.197.955,24	48
6022.2023/0005921-9	Fórmula Inc	442/SIURB/23	Obra emergencial contenção margem do Córrego Guaratiba Travessa dos Seringais	7.782.512,98	7.782.512,98	49
6022.2023/0004838-1	FP Projetos	292/SIURB/23	Obra emergencial margens Avenida Hélio Lobo – Comunidade Beira Rio – Comunidade Rocinha	9.680.692,01	9.671.227,95	50
6022.2023/0007131-6	FP Projetos	321/SIURB/23	Obra emergencial contenção de talude Travessa Manoel Blasco – Fazenda Juta	14.629.171,63	14.629.171,63	51
6022.2023/0004695-8	Apeng	271/SIURB/23	Obra emergencial margem córrego Rua Professora Nícia de Paula	5.485.876,03	4.926.534,46	52
6022.2023/0000322-1	FFL Sinalização	087/SIURB/23	Intervenção emergencial margem do Córrego Freitas, Rua Flor do Natal	4.927.629,76	4.927.629,76	53
N / A	N / A	N / A	Ibiporanga	100.000,00	-	54
N / A	N / A	N / A	Boturussu	100.000,00	-	55
N / A	N / A	N / A	Malagoli	100.000,00	-	56
N / A	N / A	N / A	Olaria	100.000,00	-	57
N / A	N / A	N / A	Rua Augusto Farina (PRA)	100.000,00	-	58
N / A	N / A	N / A	Parque Pinheirinho D'Água	100.000,00	-	59
6022.2023/0001699-4	Consórcio JDP - Ribeirão Perus	037/SIURB/22	Minerva	79.592.076,97	65.643.649,44	60
6022.2023/0001966-7	Ramon Aguilera	247/SIURB/23	Parque do Carmo	4.542.049,35	-	61
6022.2023/0002341-9	N / A	N / A	Reservatório Córrego Franquinho	100.000,00	-	62
6022.2024/0000611-7	N / A	N / A	Reservatório Parque Rio Verde	2.189.126,39	-	63
6022.2024/0000490-4	N / A	N / A	Canalização Córrego Itaquera - Jardim São João	100.000,00	-	64
N / A	N / A	N / A	Tremembé - Trecho 7	100.000,00	-	65
6022.2023/0002734-1	TGPO Engenharia	010/SIURB/21	Drenagem Rua Bartholomeu do Canto / Av. Antonio Munhoz Bonilha, Limão	3.797.240,06	1.175.067,51	66
6022.2024/0010032-6	N / A	N / A	Reservatório Moinho Velho 1	100.000,00	-	67
N / A	N / A	N / A	Parque Chico Mendes - reforma do muro (manutenção)	100.000,00	-	68
N / A	N / A	N / A	Parque Cipoaba	100.000,00	-	69
6022.2023/0004289-8	FP Proj. e Empr. Ltda	283/SIURB/23	Rola Moça	10.653.333,60	10.616.498,77	70
6022.2023/0004288-0	FP Proj. e Empr. Ltda	281/SIURB/23	Lajeado	14.088.099,66	14.035.258,16	71
6022.2023/0004310-0	FP Proj. e Empr. Ltda	282/SIURB/23	Água Vermelha	4.877.018,54	3.986.726,63	72
6022.2023/0005687-2	Consórcio Piraporinha	020/SIURB/24	Piraporinha	32.669.705,35	8.832.060,95	73
6058.2023/0001950-7	N / A	N / A	Rua Chico Pontes	100.000,00	-	-
6022.2019/0004670-5	N / A	N / A	Boqueirão	248.270,31	-	-
6022.2020/0002685-4	N / A	N / A	Diniz	100.000,00	-	76
7910.2022/0001800-6	N / A	N / A	Jaboticabal	100.000,00	-	77
N / A	N / A	N / A	Drenagem Rua Manoel Bolivar - Jardim Carumbé	100.000,00	-	78
N / A	N / A	N / A	Reservatório "Mini" Uberabinha RU-05	100.000,00	-	79
N / A	N / A	N / A	Reservatório Uberaba RUB-2	100.000,00	-	80
N / A	N / A	N / A	Reservatório Uberabinha RUN-02	100.000,00	-	81
6022.2024/0000121-2	Caixa Econômica Federal	TC 0403.766-82/201	Reservatório Zavuvus RZ2 (era lote 2)	5.121.274,61	121.274,61	82
N / A	N / A	N / A	Tremembé - Horto - Galeria e adequações dos laços	100.000,00	-	83
N / A	N / A	N / A	Vila Leopoldina (Reservatório e Polder)	100.000,00	-	84
N / A	N / A	N / A	Bacia do Córrego Sapateiro	5.000.000,00	-	85
N / A	N / A	N / A	Canalização Itaquera	100.000,00	-	86
N / A	N / A	N / A	Aricanduva - microdrenagem (remanescente lote 1)	100.000,00	-	87
6022.2023/0002299-4	Compec Galasso Engª. e Contr.LTDA e Paulitec Constr. LTDA	014/SIURB/15	Córrego Aricanduva	-	1.000,00	215
N / A	N / A	N / A	Parelheiros / Guarapiranga	100.000,00	-	88
N / A	N / A	N / A	Varginha	100.000,00	-	89
N / A	N / A	N / A	Gethsemani	100.000,00	-	90

6022.2023/0001462-2	Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE	061/SIURB/2023	Construção do Plano Municipal de redução de riscos	588.529,65	2.917.129,10	91
N / A	N / A	N / A	Av. Alm. Delamare X Ribeirão dos Meninos OBRA	100.000,00	-	92
N / A	N / A	N / A	Córrego Paciência OBRA	100.000,00	-	93
N / A	N / A	N / A	Jardim Pantanal – micro drenagem e pavimentação	100.000,00	-	94
N / A	N / A	N / A	Av. Pres.Wilson	100.000,00	-	95
N / A	N / A	N / A	Buraco Sol Nascente (Pontilhão sob o Córrego Buracão) OBRA	100.000,00	-	96
6022.2023/0004877-2	Mathesis Eng. Constr. LTDA	434/SIURB/23	Córrego localizado na Rua Raimundo Machado	354.067,08	-	97
6022.2023/0005119-6	Abcon Consult. Eng. Eireli	305/SIURB/2023	Córrego localizado na Rua Maria das Dores Abranches	70.522,14	-	98
6022.2023/0005247-8	A3 Terraplanagem Eng. LTDA	102/SIURB/2024	Galeria de águas pluviais localizado na Rua Torroselas	23.713.002,80	22.274.048,40	99
6022.2023/0001456-8	System Engenharia S/S Ltda	310/SIURB/2023	Projeto executivo e serviços ambientais, localizado na Rua Dominique Lagru	56.513,57	-	-
6022.2023/0005920-0	Escopo Constr. Eireli	084/SIURB/2024	Córrego Rua Prof. Cosme Deodato Tadeu	22.970.460,56	22.970.459,59	100
6022.2023/0006041-1	Tumi Constr. Empr. e Log. LTDA	448/SIURB/23	Recomposição do muro e galeria no Córrego Ribeirão Piqueri	7.223.297,13	7.219.451,05	101
6022.2023/0006727-0	Escopo Constr. Eireli	450/SIURB/2023	Contenção de margem de córrego na Rua Cosmo Di Sandro	10.735.809,14	10.735.897,31	102
6022.2023/0006200-7	Apeng	293/SIURB/23	Obra emergencial margens Córrego Água Preta - R. Oliveira Martins	18.081.223,38	17.288.150,70	103
6022.2023/0006940-0	Mathesis Eng. Constr. LTDA	112/SIURB/2024	Córrego Guaratiba - Rua Nossa Senhora da Fonte	27.224.742,08	27.224.742,08	104
6022.2023/0006042-0	FP Projetos	295/SIURB/23	Obras emergencial margens Córrego Pedreira, Rua Bruno Taut	15.602.237,97	15.600.780,12	105
6022.2023/0007860-4	Dang Construtora	069/SIURB/24	Contenção de encosta Ruas João Dias da Silva e Rua Oscar de Moura Lacerda	16.961.000,00	16.960.770,71	106
6022.2024/0001186-2	Abcon Consultoria	082/SIURB/24	Drenagem Rua Arbela e Rua Bacurau	7.704.701,78	7.703.864,02	107
6022.2023/0002702-3	Consórcio Orion	043/SIURB/24	Ribeirão Itaquerá	114.353.552,91	114.352.965,60	108
6022.2023/0007382-3	Consórcio Maria Augusta	071/SIURB/24	Projeto e canalização do córrego Rua Maria Auguta da Silva	752.004,82	299.962,64	109
6022.2023/0007056-5	Consórcio Córrego Carumbé	070/SIURB/24	Galeria / Reservatório Córrego Carumbé	18.406.738,09	3.319.612,58	110
6022.2024/0002612-6	I9 Engenharia	115/SIURB/24	Contenção margem Córrego Ribeirão Vermelho	35.013.456,38	11.634.571,07	111
6022.2024/0000390-8	FFL Sinalização	081/SIURB/24	Córrego Rua Flor do Natal	33.040.106,82	29.767.759,25	112
6022.2024/0005585-1	B&B Engª e Constr. LTDA	171/SIURB/24	Projeto e Microdrenagem Av. do Estado	14.087.930,16	14.004.900,48	113
6022.2023/0006645-2	Consórcio DL Córrego Rodeio	153/SIURB/24	Projeto e Contenção Margem Córrego do Rodeio	16.761.422,97	6.733.159,06	114
N / A	N / A	N / A	Córrego Ajua - Fase 2	1.000.000,00	-	115
N / A	N / A	N / A	Córrego do Bispo	1.000.000,00	-	116
N / A	N / A	N / A	Córrego Jacupeval	1.000.000,00	-	117
6022.2024/0001526-4	N / A	N / A	Reparos Ligação Rua Matimpererê à Rua Santa Cruz do Monte Castelo, Brasília e Desabamento de escadaria - Rua Sebastião	2.000.000,00	-	118
6051.2024/0000817-7	N / A	N / A	Dias Vila Zatt	3.000.000,00	-	119
6022.2024/0005018-3	N / A	N / A	Reservatório Córrego Paraguai Éguas	1.210.202,83	-	120
2015.0.132.645-3 6022.2022/0006600-0	Almeida Sapata	009/SIURB/2018	Córrego Dois Irmãos	539.182,00	1.672.621,21	122
6022.2023/0004520-0	JB Constr. e Empree. EIRELI	299/SIURB/23	Córrego Caguaçu	10.181.549,43	8.828.917,60	143
6022.2023/0004539-0	Lettietti Cordado	086/SIURB/24	Sistema de drenagem R. Dr. Luís Aires	6.826.323,84	6.825.327,61	144
6022.2023/0004605-2	B&B Engª e Constr. LTDA	280/SIURB/23	Drenagem Av. do Estado	11.818.131,86	8.274.101,03	140
6022.2023/0004908-6	Pav Passos Construções LTDA	320/SIURB/23	Drenagem Rua Catanari x Rua Chá da Índia	289,40	289,40	148
6022.2023/0004942-6	BBC Construções e Empree. LTDA	286/SIURB/23	Intervenção emergencial contenção de talude Rua Lenda do Luar	11.742,98	11.742,98	132
6022.2023/0005118-8	Mathesis Eng. Constr. LTDA	361/SIURB/23	Intervenção emergencial contenção de talude e margem do Córrego Barro Branco x Rua das Rolinhas	13.968.862,18	13.968.862,18	134
6022.2023/0005441-1	Construtora Lettietti Cordado LTDA	270/SIURB/23	Canalização e drenagem na R. Antônio Gouveia Giudice e Av. Dos Semaneiros	6.394.986,10	4.702.427,15	146
6022.2023/0006300-3	Rodoserv Engenharia LTDA	349/SIURB/23	Contenção de talude e drenagem rua Estanislau de Toledo Piza	2.816.443,72	2.816.443,72	147
6022.2023/0006302-0	Consórcio Nova Jrapav Verão	168/SIURB/24	Obras de contenções de taludes em área de risco Rua do Verão	19.853.554,26	19.823.825,31	126
6022.2023/0006644-4	Construtora Lettietti Cordado	156/SIURB/24	Elaboração de projeto executivo para canalização na Rua Guararapes	6.377.810,63	1.276.947,02	121
6022.2023/0006659-2	Construmedic Engª e Com. LTDA	004/SIURB/24	Contenção de talude Av. Custódio de Sá e Faria	4.011.874,98	3.993.531,24	127
6022.2023/0006936-2	S C Engenharia LTDA	111/SIURB/24	Intervenção emergencial contenção de margem de córrego Rua Cotinga	5.733.291,57	5.485.649,92	135
6022.2023/0007271-1	Mathesis Eng. Constr. LTDA	119/SIURB/24	Intervenção emergencial contenção de talude Rua da Amoreira Preta	7.471.720,14	5.160.181,35	129

6022.2023/0007275-4	Escopo Constr. Eireli	117/SIURB/24	Intervenção emergencial contenção de talude Rua Pau D'Arco	8.149.559,39	8.131.101,57	125
6022.2023/0007290-8	M.A.S. Constr. e Empree. LTDA	118/SIURB/24	Intervenção emergencial contenção de talude Rua Sebastião Moreira	7.000.000,00	6.998.912,21	128
6022.2023/0007357-2	FP Projetos Empree. LTDA	317/SIURB/23	Intervenção emergencia Córrego Itaim - Avenida Marechal Tito	11.047.545,45	6.376.039,43	131 e complemento
6022.2024/0000008-9	Stein Incorporações LTDA	N /A	Córrego rua Miguel Arcanjo Dutra	2.373.630,38	-	-
6022.2024/0001539-6	Construtora Kamilos LTDA	181/SIURB/24	Microdrenagem e Canalização Afluente Córrego Oratório	6.616.125,62	-	-
6022.2024/0001655-4	Pav Passos Construções LTDA	121/SIURB/24	Projeto e execução microdrenagem Av. Afonso Mariano Fagundes	6.111.792,57	6.111.042,41	136
6022.2024/0001924-3	Consórcio LD Tiradentes	154/SIURB/2024	Projeto contenção de margem Estrada Manoel de Oliveira Ramos x Estrada Iguatemi	14.942.002,95	8.813.543,74	137
6022.2024/0002370-4	Consórcio Córrego Germano	182/SIURB/24	Projeto e Obra Canalização Córrego Germano	2.292.578,53	2.292.563,33	145
6022.2024/0002539-1	Consórcio Córrego Caguaçu	183/SIURB/24	Córrego do Caguaçu	3.038.510,18	3.038.509,76	138
6022.2024/0004342-0	Consórcio BBL Chico Pontes	143/SIURB/24	Projeto e obras microdrenagem Rua Chico Pontes	7.503.570,59	2.544.129,96	74
6022.2024/0004365-9	Consórcio BBL Bandeirantes	140/SIURB/24	Projeto e execução drenagem av. Bandeirantes do Sul.	2.875.820,95	183.599,30	130
6022.2024/0005017-5	FFL Sinalização Com. e Serv. EIRELI	170/SIURB/24	Microdrenagem Rua Agrimensor Sugaya	3.175.880,61	3.175.497,71	139
6022.2024/0005214-3	Macor Engenharia Constr. e Com. LTDA	155/SIURB/24	Intervenção emergencial contenção de encosta Rua Clóvis Moraes Barros	13.822.419,83	13.797.044,62	149
6022.2024/0005629-7	Macor Engenharia Constr. e Com. LTDA	160/SIURB/24	Canalização e contenção margens córrego Boqueirão	1.096.439,05	1.094.074,52	75
6022.2024/0007588-7	MC Engenharia e Constr. LTDA	176/SIURB/24	Obras de microdrenagem Jardim Pantanal	1.682.111,17	-	-
6022.2024/0000323-1	Consitec Engenharia	178/SIURB/24	Obras de drenagem e contenção Rua Giovanni Mosel	36.640.028,32	36.638.764,56	141 mais correção
6022.2024/0001224-9	Construtora Progredior	177/SIURB/24	Obras de contenção de encosta Rua Antonio Elias	11.000.186,83	10.999.857,86	133
6022.2024/0002532-4	Consórcio Córrego Abacateiro	192/SIURB/2024	Córrego Abacateiro	-	743.243,13	124
6022.2024/0002536-7	M.A.S. Constr. e Empree. LTDA	184/SIURB/24	Córrego Itupu - Jardim Angela	-	2.252.871,56	123
6022.2024/0009293-5	Naspe Engenharia e Construtora LTDA	187/SIURB/24	Av. Dr. Gastão Vidigal	-	10.015.023,93	142
Totais				1.447.197.043,27	1.203.101.592,66	

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SIURB - 86.22.17.451.3008.5013.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
Diversos Projetos de Drenagem:				44.787.108,54		No documento 144750770, pgs: 150
6022.2020/0002457-6	WEBER	069/SIURB/20	Luz (Princesa Isabel + galeria prates);		-	152
6027.2020/0009403-2		N/A	Pedreira de Guaianazes;		-	153
N/A		N/A	PRAR – Programa de Redução de Alagamentos e Riscos;		-	154
N/A		N/A	Reservatório Parque Rio Verde;		-	155
N/A		N/A	Reservatório Verde Abegoária;		-	156
7910.2022/0000447-1	N/A	N/A	Anhangabaú (reservatório Nove de Julho);		-	157
N/A	N/A	N/A	Av. Alm. Delamare X Ribeirão dos Meninos;		-	158
6022.2023/0001047-3	KF2 Engª e Consult LTDA	073/SIURB/24	Córrego Paciencia		35.510,28	201
6022.2024/0000120-4	Caixa Econômica Federal	TC 0420.066-76/201	Córrego Paciencia		54.057,58	159
6022.2022/0004058-3	São Paulo Obras	014/SIURB/24	Riacho Ipiranga		91.756,09	160
N/A	N/A	N/A	Reservatório Aricanduva AR4;		-	161
N/A	NA	N/A	Reservatório Cassandoca;		-	162
6022.2023/0002075-4	Hidrostudio Engª	075/SIURB/24	Reservatório Tremembé R2 / R4 / R6		850.578,31	163
N/A	N/A	N/A	Reservatórios Anhangabaú (23 de maio/ Bandeiras / Avanhandava / Mercadão)		-	192
6022.2024/0001164-1	SP-Obras	059/SIURB/24	Córrego Freitas		325.902,87	198
6022.2024/0006162-2	Postigo Projeto de Engenharia LTDA	162/SIURB/2024	Córrego Jacupeval - Itaquera		84.257,00	200
6022.2024/0007908-4	Acanthus Projetos e Soluções LTDA	167/SIURB/24	Córrego Rapadura Av. Conselheiro Carrão		63.443,56	-
6022.2024/0003008-5	Ramon Aguilera Partic. Empr. LTDA	172/SIURB/24	Microdrenagem na Rua Pires de Oliveira – Granja Julieta		-	-

6022.2023/0006521-9, 6022.2023/0006606-1, 7910.2022/0001651-8	N/A	N/A	Reservatórios Sapateiro (Obelisco / Mario Cardim/ Sena Madureira/ Lago Ibirapuera);	-	164
7910.2022/0001651-8	SP-OBRAS	N.A.	Parque Linear Tapera - Zona Leste	-	165
7910.2022/0001651-8			Tiquatira		166
N/A	N/A	N/A	Boqueirão;	-	167
6022.2019/0005243-8			Boturussu;	-	168
6022.2021/0000618-9	KF2 Engª e Consult. LTDA	068/SIURB/22	Cordeiro – Fase 2	299.351,36	169
N/A	N/A	N/A	Jardim Lapenna (Canalização + Polder Reservatório)	-	170
6022.2020/0001054-0			Malagoli;	-	171
6022.2023/0001699-4	Consórcio Minerva	277/SIURB/23	Minerva;	9.370.440,96	172
6022.2020/0002689-7	Roma Engenharia e Consultoria Ltda	057/SIURB/21	Córrego Olaria	-	173
6027.2022/0015036-0			Parque Cipoaba;		174
N/A	N/A	N/A	Reservatório Cortume/Tiburtino	-	175
N/A	N/A	N/A	Reservatório João Moura;	-	176
N/A	N/A	N/A	Reservatório Praça Portugal,	-	177
N/A	N/A	N/A	Vila Leopoldina (Reservatório e Polder),	-	178
N/A	N/A	N/A	Reservatório Uberabinha,	-	179
6022.2024/0002039-0	SP-OBRAS	093/SIURB/24	Rua Guarei x Rua Natal - Mooca	48.281,91	180
6022.2023/0001456-8	System Engenharia LTDA	310/SIURB/23	Rua Dominique Lagru - Butanta	137.065,05	181
6022.2021/0001036-4	SPObras	154/SIURB/23	Projeto Microdrenagem Pantanal	83.987,60	197
N/A	N/A	N/A	Jd. Carumbé,	-	182
N/A	N/A	N/A	Ponte Rasa,	-	183
N/A	N/A	N/A	Itaquera,	-	184
N/A	N/A	N/A	Itararé,	-	185
N/A	N/A	N/A	Av. Alm. Delamare,	-	186
N/A	N/A	N/A	Sol Nascente.	-	187
N.A.	N.A.	N.A.	Projetos de SVMA	1.000,00	-
Diversos	N.A.	N.A.	Trabalho Social e Cadastramento	200.000,00	-
Diversos	N.A.	N.A.	Material Expropriatório - Drenagem	3.600.000,00	-
6022.2022/0001931-2	FCTH	208/SIURB/22	Cadernos de Drenagem - FCTH	16.290.825,61	10.986.736,31
6022.2023/0003814-9	Consórcio Infra INFRA L2M	300/SIURB/2023	Gerenciamento Obras de Drenagem Lote 1	26.505.222,16	17.032.427,95
6022.2023/0003814-9	Consórcio Infra SP	301/SIURB/2023	Gerenciamento Obras de Drenagem Lote 2	25.910.744,56	15.364.811,09
6022.2023/0003814-9	Consórcio Gerenciador CHP	302/SIURB/2023	Gerenciamento Obras de Drenagem Lote 3	25.730.536,85	16.661.490,76
6022.2021/0003041-1		São Paulo Obras - SP	Gerenciamento SPOBRAS, abaixo:	15.901.815,68	-
6022.2024/0002132-9	SPObras	068/SIURB/24	Corrego dos Machados	149.668,49	196
7910.2024/0000809-8	SPObras	018/SIURB/2023	Reservatórios dos Machados	1.060,80	205
6022.2023/0007636-9	SPObras	015/SIURB/24	Córrego Mooca	658.376,58	193
6022.2019/0004946-1	SPObras	144/SIURB/2023	Rua Professor Giuliani	29.209,96	194
6022.2023/0004079-8	SPObras	197/SIURB/23	Microdrenagem Aricanduva	64.954,41	195
6022.2024/0008346-4	Transvias Constr. e Terraaplanagem LTDA Fundação para o	188/SIURB/24	Av Morvan Dias Figueiredo - Vila Maria/Vila Guilherme	17.428.206,34	202
6022.2023/0001462-2	Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia – FDTE	061/SIURB/2023	Plano Municipal de Redução de Riscos	6.870.559,91	203
6022.2022/0002709-9	Atoanni Construções e Serv. LTDA	278/SIURB/22	Compensação Ambiental	120.831,14	204
6022.2023/0006085-3	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	351/SIURB/23	Normas Técnicas de Pavimentção Urbana	5.510.535,75	199
Totais			158.927.253,40	102.323.502,06	

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM (AQUISIÇÃO DE ÁREAS) - SIURB - 86.22.17.451.3008.5013.44.90.61.00.03

Processo Adm.	Identificação da Ação	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
	Desapropriações para as frentes: Córregos Diniz, Malagoli, Olaria, Vila Leopoldina, Freitas, Perus, Morro do S, Ponte Baixa, Água PodreDois Irmãos, Capão Redondo, Uberabinha, Cordeiro, Tremembé e Paciência.	17.230.168,00		No documento 144750770, pgs:
6021.2024/0039214-3	Ponte Baixa		1.649.764,21	214
6022.2019/0002550-3	Implantação do Córrego Tremembé 7		60.911,17	212
6022.2019/0003068-0	Canalização do Trecho 7 do Córrego Tremembé		55.793,27	212
6022.2019/0004938-0	Córrego Tremembé - Reservatório 2		4.538,76	212
6022.2022/0006969-7	Implantação do Reservatório do Morro do S		58.673,94	213
6022.2023/0001687-0	Canalização do Ribeirão Perus e Implantação de Reservatórios		1.902,87	210

6022.2023/0001689-7	Canalização do Ribeirão Perus e Implantação de Reservatórios			4.537.665,08	210
6022.2023/0006432-8	Serviço Técnico ação expropriatória Capão Redondo			107.115,07	211
6022.2023/0006433-6	Implantação do Reservatório do Morro do S			796.992,16	213
6022.2023/0006435-2	Implantação do Reservatório do Morro			2.346.996,83	213
6022.2023/0006436-0	Reservatório do Morro do S - RMS01			17.711,85	213
6022.2023/0006437-9	Implantação do Reservatório do Morro do S			327.885,91	213
Totais				17.230.168,00	9.965.951,12

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM (INDENIZAÇÃO) - SIURB - 86.22.17.451.3008.5013.44.90.93.00.03

Processo Adm.	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6022.2023/0002299-4	Compec Galasso Eng. e Constr. / Paulitec Constr. LTDA	014/SIURB/15	Córrego Aricanduva	43.287.822,29	43.286.822,29	215
Totais				43.287.822,29	43.286.822,29	

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) - SIURB - 86.22.17.451.3008.5013.44.90.93.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6022.2022/0004000-1	São Paulo Urbanismo	01/SIURB/2023	Projeto Microdrenagem Jd. Pantanal	(na dotação de Serviços .91)	2.119.588,14	151
Totais				-	2.119.588,14	

COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SIURB - 86.22.15.452.3005.5087.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6022.2022/0002709-9	A. Tonanni Contr. e Serv. LTDA	278/SIURB/22	Diversas Compensações Ambientais das Ações de SIURB	1.120.831,14		Documento 144750770, página:
6022.2020/0000363-3	Tetra Mais Consultoria Ltda	052/SIURB/20	Compensação ambiental TCAs e TCRAs Lote 1		296.612,19	207
6022.2022/0002719-6	Molise Serviços e Construções Ltda	191/SIURB/22	Compensação ambiental TCAs e TCRAs Lote 5		75.478,98	209
6022.2022/0004863-0	Potenza Engenharia e Construção Ltda	195/SIURB/22	Compensação ambiental TCAs e TCRAs Lote 3		242.123,79	206
6022.2022/0002711-0	Florestana Constr. e Serv. LTDA	190/SIURB/22	Compensação ambiental TCAs e TCRAs Lote 2		254.971,61	208
					130.813,41	DOC: 158242372
Totais				1.120.831,14	999.999,98	
TOTAL SIURB - FMSAI - Fonte 03				1.667.763.118,10	1.361.797.456,25	

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM - (PROJETOS E OBRAS) - SMSUB - 86.12.17.451.3005.5013.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6012.2023/0012257-9	Consórcio – AS/M.A.S.	1.131/SMSUB/COGE	Obras de contenção de margem no Córrego Tabatinguera - Rua Carolina Soares x Rua Madelena Madureira	15.000.000,00	14.998.810,59
6012.2024/0021151-4	N.A.	N.A.	Obras de Drenagem e Revitalização do Parque Mooca	10.000.000,00	-
6012.2024/0024986-4	N.A.	N.A.	Projeto e Obras canalização do Córrego Limoeiro	2.000.000,00	-
6012.2024/0026430-8	N.A.	N.A.	Projeto e Obras contenção de margem de Córrego Ribeirão Itaquera	2.000.000,00	-
6059.2024/0009549-9	N.A.	N.A.	Drenagem das Galerias da Rua Abílio Soares e Rua Curitiba	2.000.000,00	-
6012.2023/0020600-4	FBF Construções e	62/SMSUB/24	Serviços de Drenagem em Ruas de Terra: Rua Carvalho, Rua Mogno e outras	1.500.000,00	1.499.999,52
Totais				32.500.000,00	16.498.810,11

OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICOS (PROJETOS E OBRAS) - SMSUB - 86.12.15.543.3022.1193.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6029.2020/0001311-4	N.A.	Cidade Ademar	Projeto executivo e obras de contenção de talude em área de risco na Rua Pedro Francelino dos Santos - Eldorado	3.985.159,46	-
6041.2020/0000887-6	Construtora Lettieri Cordaro Ltda	Itaquera	Obras de contenção de margem de córrego e encosta nas Ruas Dolomites, Antonio Campitelli e Saul Borges Carneiro	4.818.584,20	-
6012.2023/0026389-0	N.A.	Aricanduva/ Formosa	Solo grampeado no talude existentes nos fundos do CDC Estrela localizado na Rua Floriza	4.085.240,85	-

6012.2023/0012256-0	FBF Construções e Serviços Eireli	Cidade Tiradentes	Projeto e obras de drenagem no Córrego do Jardim Vitória (SUB-CT) – Travessa Cachoeira de Paulo Afonso	11.206.314,93	11.203.696,11	117075086
6040.2024/0001141-0	Construio Engª e Empr. LTDA	Itaim Paulista	Obra de contenção e drenagem em área de risco no Córrego Lageado - Rua Luis Garambeu	12.905.316,71	7.023.086,40	117075088
6040.2024/0001071-6	Construio Engª e Empr. LTDA	Itaim Paulista	Obra de contenção e drenagem em área de risco no Córrego Tijuco Preto - Avenida Marechal Tito até a Rua Eric Portiman	3.690.301,63	3.666.069,55	117075090
-	-	-	a definir	3.867.369,96	-	N.A.
Totais				44.558.287,74	21.892.852,06	
TOTAL SMSUB - FMSAI - Fonte 03				77.058.287,74	38.391.662,17	

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES URBANOS E LINEARES (PROJETOS E OBRAS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1702.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6027.2019/0011497-0	Engecon ABC Const. Empr. e Incorp. LTDA	056/SVMA/2020 - C	Pq. dos Búfalos - Obra de implantação - 2ª fase de implantação	14.791.744,98	13.626.105,63	119435683
a autuar	a contratar	Cidade Ademar	Pq. dos Búfalos - Obra de cercamento	250.000,00	-	-
6027.2023/0006871-1	Ramon Aguilera Part. e Empr. Ltda	055/SVMA/2023	Pq. Morumbi Sul - Obra de implantação	15.110.035,17	13.716.305,61	119439824
6027.2023/0007120-8	Agrícola e Constr. Monte Azul	038/SVMA/2023 - Sa	Pq. Fazenda da Juta - Obra de implantação	7.605.458,63	3.516.261,23	126445976
6027.2024/0002860-6	a contratar	Sapopemba	Pq. Fazenda da Juta (Agave Dragão) - Obra de cercamento	976.515,54	-	N.A.
Totais				38.733.754,32	30.858.672,47	

AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES URBANOS E LINEARES (PROJETOS E OBRAS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1703.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6027.2022/0000961-6	a contratar	-	Pq. Vila Guilherme/Trote - Obra de Ampliação e Restauo	1.000,00	-	N.A.
6027.2022/0000959-4	Lemam Construções E Comércio S/A.	026/SVMA/2023	Pq. Pinheirinho D'Água - Obras de Requalificação - FASE 2	5.889.247,54	5.886.770,17	121028694
6027.2023/0007426-6	Lemam Construções E Comércio S/A.	041/SVMA/2023	Pq. Consciência Negra - Obra de requalificação	4.381.168,18	4.103.995,88	126447995
6027.2023/0016936-4	a licitar	-	Pq. Tatuapé - Obra de Implantação da Fase 02	1.000,00	-	N.A.
6027.2022/0000937-3	Consitec Engenharia E Tecnologia Ltda	058/SVMA/2022	Pq. Chácara do Jockey - Obra de Acessibilidade - Fase 01 (acessos)	1.000,00	-	N.A.
6027.2024/0007094-7	a contratar	-	Pq. Raposo Tavares e Pq. Vila do Rodeio - Obra de requalificação dos campos	2.991,34	-	N.A.
6027.2023/0006430-9	Monteiro Engenharia E Arquitetura Ltda	022/SVMA/2024	Pq. Shangrilá - Obras de requalificação - Cercamento	2.400.000,00	1.917.857,22	119440143
6027.2023/0003415-9	Const.E Adm. Serviços Ltda	017/SVMA/2024	Pq. Aterro Sapopemba - Obras de requalificação	5.664.967,33	2.934.365,43	126088303
6027.2023/0007648-0	Construdaheer Const. e Serviços Ltda.	062/SVMA/2024	Pq. Linear Mongaguá - Obras de requalificação	618.613,47	536.025,79	126088743
Totais				18.959.987,86	15.379.014,49	

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (PROJETOS E OBRAS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1704.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6027.2022/0000948-9	Emergo Construcão e Servicos Ltda	Cidade Tiradentes	Pq. Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva (PNMCA)	5.331.045,82	3.059.237,90	126089354
Totais				5.331.045,82	3.059.237,90	

AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (PROJETOS E OBRAS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1705.44.90.51.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6027.2023/0003727-1	a contratar	Itaquera	Pq. Natural Fazenda do Carmo - Obra de requalificação	2.000,00	-	-
Totais				2.000,00	-	

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES URBANOS E LINEARES (DESAPROPRIAÇÕES) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1702.44.90.61.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
Diversos			Aquisição de imóveis para implantação de parques municipais	181.509.309,06	-	Planilha 126688908
6027.2024/0025160-7			Jd. Apurá - Bufalos - ampliação		252.683,57	
6027.2024/0025163-1			Jd. Apurá - Bufalos - ampliação		535.673,45	
6027.2024/0025162-3			Jd. Apurá - Bufalos - ampliação		491.296,50	
6027.2024/0025159-3			Jd. Apurá - Bufalos - ampliação		867.249,51	
6027.2024/0025161-5			Jd. Apurá - Bufalos - ampliação		1.130.000,87	

6027.2023/0016187-8	Aristocrata - ampliação	184.107,51
6027.2024/0028873-0	Fazenda Castanheiras	16.300.000,00
6027.2024/0021033-1	Ilha do Bororé	69.451,09
6027.2024/0021032-3	Ilha do Bororé	4.965.330,92
6027.2024/0031431-5	Mananciais Paulistanos - Billings	3.294.108,97
6027.2024/0031430-7	Mananciais Paulistanos - Billings	1.642.197,64
6027.2024/0031433-1	Mananciais Paulistanos - Billings	6.575.721,21
6027.2024/0031432-3	Mananciais Paulistanos - Billings	315.506,81
6027.2024/0031428-5	Mananciais Paulistanos - Billings	152.592,16
6027.2024/0031424-2	Mananciais Paulistanos - Billings	406.125,00
6027.2024/0031429-3	Mananciais Paulistanos - Billings	84.324,73
6027.2024/0006495-5	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	4.117.039,75
6027.2024/0006518-8	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	3.384.337,42
6027.2024/0006507-2	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	233.727,39
6027.2024/0006772-5	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	407.416,25
6027.2024/0006758-0	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	2.213.718,07
6027.2024/0006508-0	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	714.124,84
6027.2024/0006516-1	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	1.727.645,53
6027.2024/0006768-7	Ribeirão Caulim (fase I ou norte)	400.985,68
6027.2024/0031282-7	Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo	1.389.105,18
6027.2024/0031285-1	Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo	2.182.046,21
6027.2024/0030744-0	Borda da Cantareira - Bananal-Canivete	191.296,83
6027.2024/0031017-4	Borda da Cantareira - Bananal-Canivete	1.508.035,68
6027.2024/0030743-2	Borda da Cantareira - Bananal-Canivete	728.571,54
6027.2024/0031018-2	Borda da Cantareira - Bananal-Canivete	319.333,61
6027.2024/0030745-9	Borda da Cantareira - Bananal-Canivete	2.285.106,55
6027.2024/0015147-5	Morro Grande	14.250,22
6027.2024/0008015-2	Morro Grande	861.802,98
6027.2024/0018911-1	Morro Grande	232.496,32
6027.2024/0015192-0	Morro Grande	42.631,18
6027.2024/0006171-9	Morro Grande	37.151,59
6027.2024/0008000-4	Morro Grande	2.979.796,28
6027.2024/0008004-7	Morro Grande	48.142,89
6027.2024/0008003-9	Morro Grande	2.019.260,10
6027.2024/0008017-9	Morro Grande	156.214,26
6027.2024/0008022-5	Morro Grande	437.975,88
6027.2024/0014728-1	Morro Grande	146.611,14
6027.2024/0008012-8	Morro Grande	3.532.704,10
6027.2024/0030937-0	Embu Mirim	392.122,00
6027.2024/0030931-1	Embu Mirim	13.447.160,20
6027.2024/0030936-2	Embu Mirim	3.153.208,39
6027.2024/0030934-6	Embu Mirim	427.200,49
6027.2022/0008437-5	Guavirubata	9.064.477,04
6011.2020/0001915-7	Alto da Moóca - Pe. Benedito M. Cardoso	1.598.038,16
6047.2023/0001641-9	Nascentes do Ribeirão Colônia - Sítio Irma	4.318.919,42
6027.2024/0014923-3	Recreio de Parelheiros	3.494.722,00
6027.2024/0014925-0	Recreio de Parelheiros	3.469.040,03
6027.2024/0014251-4	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	1.375.057,51
6027.2024/0014254-9	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	1.221.071,14
6027.2024/0014256-5	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	790.341,03
6027.2024/0014245-0	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	680.715,72
6027.2024/0013103-2	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	659.198,21
6027.2024/0012328-5	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	4.084.919,31
6027.2024/0012324-2	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	2.339.698,98
6027.2024/0013104-0	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	1.604.141,19
6027.2024/0013099-0	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	420.850,43
6027.2024/0013098-2	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	1.471.016,32
6027.2024/0012317-0	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	3.662,19
6027.2024/0012291-2	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	3.788.006,11
6027.2024/0012320-0	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	2.830.173,60
6027.2024/0013107-5	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	368.913,59
6027.2024/0014242-5	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	1.330.349,97
6027.2024/0012311-0	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	2.823.122,31
6027.2024/0012286-6	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	749.569,06
6027.2024/0014255-7	Ribeirão Caulim (fase III ou sul)	3.414.997,66
6027.2024/0013119-9	Ribeirão Caulim (fase IV ou sudeste)	290.009,66
6027.2024/0013132-6	Ribeirão Caulim (fase IV ou sudeste)	2.188.019,31
6027.2024/0013131-8	Ribeirão Caulim (fase IV ou sudeste)	1.254.760,67
6027.2024/0013116-4	Ribeirão Caulim (fase IV ou sudeste)	663.966,56
6027.2024/0013111-3	Ribeirão Caulim (fase IV ou sudeste)	188.817,82
6027.2024/0018587-6	Chácara Alfomares	10.515.298,86
6027.2024/0018591-4	Chácara Alfomares	4.071.912,23

6021.2024/0072757-9	Morro Grande	3.593.334,38
Totais	181.509.309,06	161.664.708,96

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS (Serviços de Terceiros) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1702.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
6027.2024/0008481-6/11516-9/233296-3	A ajuizar		Serviços Técnicos para ações de desapropriações para implanatação de Parques	5.000.000,00	-	Planilha 126688908
6027.2024/0011516-9	Cappe Brasil Engª LTDA - EPP	058/SVMA/2024	Morro Grande		760.744,11	
6027.2024/0023296-3	GAB Engenharia LTDA	083/SVMA/2024	Orla do Guarapiranga - Riviera Paulista		1.655.428,76	
6027.2024/0008481-6	Núcleo Engª Consultiva S. A.	047/SVMA/2024	Nascentes do Ribeirão Colônia - Sítio Irma		60.060,49	
Totais				5.000.000,00	2.476.233,36	

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (AQUISIÇÃO DE MÓVEIS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1704.44.90.61.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
			Desapropriações para implantação de unidades de conservação	154.523.467,06	-	Planilha 126688908
6027.2024/0028869-1			Fazenda Castanheiras		4.593.460,17	
6027.2024/0028873-0			Fazenda Castanheiras		10.020.133,50	
6027.2024/0028877-2			Fazenda Castanheiras		184.556,52	
6027.2024/0028875-6			Fazenda Castanheiras		4.881.177,17	
6027.2024/0028870-5			Fazenda Castanheiras		468.056,45	
6027.2024/0029904-9			Fazenda Castanheiras		2.727.303,64	
6027.2024/0028874-8			Fazenda Castanheiras		3.544.552,87	
6027.2024/0029899-9			Fazenda Castanheiras		1.898.569,96	
6027.2024/0029900-6			Fazenda Castanheiras		427.843,11	
6027.2024/0029897-2			Fazenda Castanheiras		11.882.471,40	
6027.2024/0029902-2			Fazenda Castanheiras		1.028.200,33	
6027.2024/0029903-0			Fazenda Castanheiras		448.197,37	
6027.2024/0028871-3			Fazenda Castanheiras		4.900.896,05	
6027.2024/0028872-1			Fazenda Castanheiras		425.552,12	
6027.2024/0029901-4			Fazenda Castanheiras		1.035.593,38	
6027.2024/0029898-0			Fazenda Castanheiras		1.203.234,46	
6027.2024/0030182-5			Varginha - ampliacao		3.094.837,98	
6027.2024/0031277-0			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		597.851,32	
6027.2024/0031280-0			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		984.626,92	
6027.2024/0031296-7			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		5.522.731,21	
6027.2024/0031294-0			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		798.771,07	
6027.2024/0031291-6			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		171.291,22	
6027.2024/0031276-2			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		60.915,93	
6027.2024/0031275-4			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		4.262.110,31	
6027.2024/0031292-4			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		94.438,10	
6027.2024/0031286-0			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		14.526.959,20	
6027.2024/0031290-8			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		68.683,71	
6027.2024/0031288-6			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		280.299,62	
6027.2024/0031279-7			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		434.580,97	
6027.2024/0031297-5			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		950.153,36	
6027.2024/0031283-5			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		1.013.035,67	
6027.2024/0031295-9			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		997.506,98	
6027.2024/0031293-2			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		72.876,20	
6027.2024/0031289-4			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		508.282,42	
6027.2024/0031281-9			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		231.313,74	
6027.2024/0031287-8			Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		235.191,11	
6027.2024/0028657-5			Jaceguava - ampliação		1.997.818,08	
6027.2024/0028660-5			Jaceguava - ampliação		1.949.304,03	
6027.2024/0028658-3			Jaceguava - ampliação		2.586.718,74	
6027.2024/0025233-6			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		574.409,38	
6027.2024/0025225-5			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		436.551,13	
6027.2024/0024959-9			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		245.826,00	
6027.2024/0025224-7			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		497.512,64	
6027.2024/0023478-8			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		429.774,16	
6027.2024/0025216-6			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		2.508.128,15	
6027.2024/0023481-8			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		4.525.852,81	
6027.2024/0024967-0			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		1.343.544,96	
6027.2024/0025223-9			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		422.468,83	
6027.2024/0025232-8			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		330.719,46	
6027.2024/0023480-0			Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		922.863,40	

6027.2024/0024953-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	52.444,56
6027.2024/0025231-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	334.936,26
6027.2024/0024966-1	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	236.778,00
6027.2024/0024963-7	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	268.584,00
6027.2024/0025219-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	136.435,68
6027.2024/0025218-2	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	339.859,50
6027.2024/0025222-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	415.983,57
6027.2024/0024949-1	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	81.211,32
6027.2024/0025220-4	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	123.935,90
6027.2024/0024955-6	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	556.054,07
6027.2024/0024964-5	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	729.665,63
6027.2024/0024954-8	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	214.867,20
6027.2024/0025235-2	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	1.189.191,00
6027.2024/0024961-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	221.228,40
6027.2024/0023477-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	9.036.939,60
6027.2024/0025228-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	1.780.671,00
6027.2024/0025239-5	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	1.185.664,40
6027.2024/0025236-0	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	997.518,00
6027.2024/0025227-1	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	133.695,61
6027.2024/0025221-2	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	121.791,59
6027.2024/0023479-6	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro	22.091.905,71
6027.2024/0031285-1	Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo	1.867.341,27
Totais		154.523.467,06 145.464.449,58

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (Serviços de Terceiros - SVMA - 86.27.18.541.3005.1704.44.90.39.00.03

Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	Valor Aprovado	Valor Utilizado	SEI de Prestação
			Serviços Técnicos para desapropriações para Implantação de Unidades de Conservação	15.000.000,00		Planilha 126688908
6027.2024/0025856-3	GAB Engenharia LTDA	090/SVMA/2024	Cratera de Colônia - Taquacetuba		2.582.113,80	
6027.2024/0004527-6	Núcleo Engª Consultiva S. A.	031/SVMA/2024	Fazenda Castanheiras		257.402,10	
6027.2024/0023309-9	GAB Engenharia LTDA	082/SVMA/2024	Mananciais Paulistanos - Itaim-Viterbo		1.024.649,31	
6027.2024/0029067-0	GAB Engenharia LTDA	087/SVMA/2024	Mananciais Paulistanos - Paulo Guilguer		2.174.627,34	
6027.2024/0029068-8	GAB Engenharia LTDA	089/SVMA/2024	Mananciais Paulistanos - Ribeirão Bororé		2.975.974,66	
6027.2024/0007000-9	Núcleo Engª Consultiva S. A.	048/SVMA/2024	Varginha - ampliacao		128.701,05	
6027.2024/0006002-0	Núcleo Engª Consultiva S. A.	051/SVMA/2024	Borda da Cantareira - Itaguaçu-Bispo		369.568,80	
6027.2024/0006003-8	Cappe Brasil Engª LTDA - EPP	049/SVMA/2024	Borda da Cantareira - Bananal-Canivete		200.284,25	
6027.2024/0012165-7	Cappe Brasil Engª LTDA - EPP	061/SVMA/2024	Borda da Cantareira - Barrocada		357.734,66	
6027.2024/0011522-3	Núcleo Engª Consultiva S. A.	059/SVMA/2024	Embu Mirim		171.601,40	
6027.2024/0009333-5	Núcleo Engª Consultiva S. A.	054/SVMA/2024	Jaceguava - ampliação		25.740,21	
6027.2024/0004531-4	Cappe Brasil Engª LTDA - EPP	035/SVMA/2024	Pico do Votussununga - Morro do Cruzeiro		350.266,84	
6027.2024/0007000-9	Núcleo Engª Consultiva S. A.	048/SVMA/2024	Parque Natural Municipal Varginha		128.701,05	
Totais				15.000.000,00	10.747.365,47	
TOTAL SVMA - FMSAI - Fonte 03				419.059.564,12	369.649.682,23	
TOTAL - FMSAI - Fonte 03				3.225.182.393,84	2.747.628.128,50	
